

#CULTURE
#ACCESSIBILITA'
#INCLUSIONE
#PARTECIPAZIONE

PIÙ
[piano integrato urbano]

Presentazione Giunta Comunale

2/11/2022

*Dipartimento Fondi Europei e PNRR
Divisione Trasformazioni Periferie, Beni Comuni
e Rigenerazione Urbana
Città di Torino*

PNRR M5C2I2.2 Piani Urbani Integrati art. 21 DL 152/21 del 6/11/21

Amministrazione titolare **Ministero degli Interni**

Città Metropolitana di Torino complessivi **€ 233.947.918 mln**
Torino Metropoli aumentata e PIÙ

Città di Torino **€ 113.395.160,11 mln**

PIÙ


deliberazione GC del 8/03/2022
ammissione al finanziamento 22/04/22
atto d'obbligo del Sindaco del 8/06/2022

Domanda per aumento costi opere indifferibili

€ 18.033.655,20 € (in attesa di concessione)

MILESTONE - TARGET

- Aggiudicazione lavori entro **30 luglio 2023**
- 30% SAL entro **30 settembre 2024**
- Fine lavori entro **30 giugno 2026**

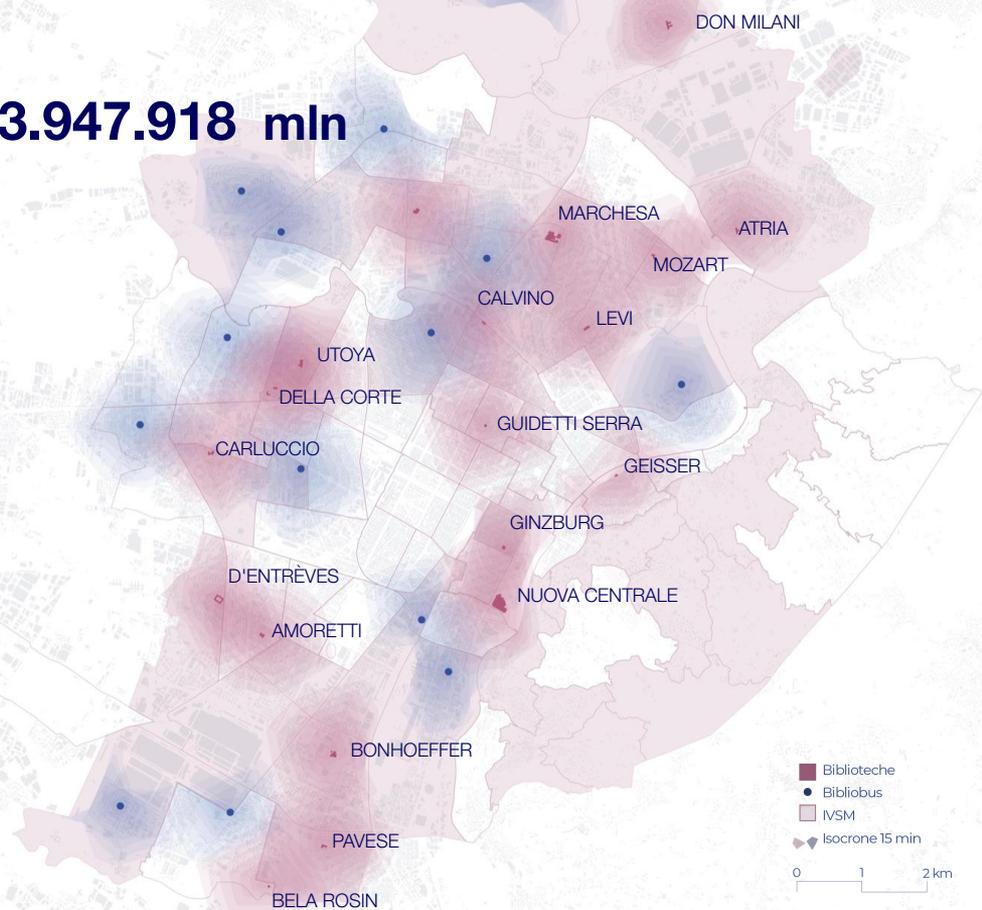

Obiettivo 1

#culture

Migliorare la qualità, l'accessibilità, l'efficienza energetica e l'assetto infrastrutturale del sistema bibliotecario urbano.

Obiettivo 3

#inclusione

Realizzare e riqualificare le infrastrutture per l'inclusione sociale, il presidio territoriale, la produzione e la fruizione socio-culturali, educative, sportive.

Obiettivo 2

#accessibilità


Aumentare l'accessibilità fisica e sensoriale, la resilienza, la qualità di aree verdi e spazi aperti pubblici e promuovere la socialità urbana nelle aree mercatali di quartiere.


Obiettivo 4

#partecipazione

Accompagnare la ripresa, la resilienza, lo sviluppo economico della città e l'accessibilità delle infrastrutture sociali urbane attraverso l'aggancio, il coinvolgimento, il protagonismo delle persone.

ID AZIONE	CUP	IMPORTO	Amoretti	Atria	Bela Rosin	Bonhoeffer	Calvinco	Carluccio	Chimico	Colle Carlo	Don Milani	Geisser	Guidetti Serra	Levi	Marchesa	Mozart	Passerin D'entreves	Paveese	Utoya	Bibliobus
A1 ALLESTIMENTO BIBLIOTECHE	C14E22000030006	5.315.485,00 €	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
A2 DIGITALIZZAZIONE BIBLIOTECHE	C14E22000020006	2.449.690,00 €	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
A3 BIBLIOBUS	C14E22000040006	675.000,00 €	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
A4 RIQUALIFICAZIONE BIBLIOTECHE AMORETTI, DELLA CORTE, BELA ROSIN	C12F22000030001	2.800.000,00 €	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
A5 RIQUALIFICAZIONE BIBLIOTECHE BONHOEFFER, GINZBURG MARCHESA E CASA DEL QUARTIERE	C12F22000040001	6.300.000,00 €	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
A6 RIQUALIFICAZIONE BIBLIOTECA CALVINO E MAGAZZINI	C12F22000050001	1.000.000,00 €	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
A7 RIQUALIFICAZIONE BIBLIOTECA CARLUCCIO E CENTRO CIVICO	C12F22000060001	5.000.000,00 €	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
A8 NUOVA BIBLIOTECA COGNASSO	C12F22000070001	4.000.000,00 €	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
A9 RIQUALIFICAZIONE CENTRO PROTAGONISMO GIOVANILE E CENTRO SOCIO-ASSISTENZIALE	C12E22000080001	4.400.000,00 €	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
A10 RIQUALIFICAZIONE MAGAZZINO BIBLIOTECHE	C12F22000100001	5.600.000,00 €	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
A11 RIQUALIFICAZIONE BIBLIOTECHE PAVESE, PASSERIN D'ENTREVES E CENTRI DEL PROTAGONISMO GIOVANILE	C12F22000080001	4.500.000,00 €	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
A12 ACCESSIBILITA' E RIQUALIFICAZIONE SPAZIO PUBBLICO - AREA NORD	C17E22000720006	5.888.000,00 €	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
A13 ACCESSIBILITA' E RIQUALIFICAZIONE SPAZIO PUBBLICO - AREA SUD	C17E22000760006	6.200.000,00 €	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
A14 RIQUALIFICAZIONE GIARDINI STORICI BIBLIOTECHE AMORETTI E DELLA CORTE	C18E22000010006	2.000.000,00 €	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
A15 RIQUALIFICAZIONI AREE VERDI	C18E22000000006	3.000.000,00 €	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
A16 RIQUALIFICAZIONI AREE VERDI - RISANAMENTO E POTATURA ALBERATE	C11G22000090006	3.000.000,00 €	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
A17 RIQUALIFICAZIONE MERCATI BRUNELLESCHI E PORPORA	C12F22000000006	2.000.000,00 €	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
A18 RIQUALIFICAZIONE MERCATI GIALLA, PAVESE, MADAMA CRISTINA	C12F22000010006	2.100.000,00 €	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
A19 RIQUALIFICAZIONE MERCATI NITTI, BALTIMORA, DON GREGG SEBASTIOPOLI	C12F22000020006	1.800.000,00 €	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
A20 RIQUALIFICAZIONE EDIFICI SOCIALI VIA LEONCAVALLO E BIBLIOTECA LEVI	C17E22000150006	3.900.000,00 €	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
A21 RIQUALIFICAZIONE EDIFICI SOCIALI VIA ROSA	C17E22000170006	1.000.000,00 €	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
A22 RIQUALIFICAZIONE ABITAZIONI SOCIALI CORSO LOMBARDA, VIA PIANEZZA, CORSO LECCO, VIA FABRIZI	C17E22000860006	800.000,00 €	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
A23 NUOVO HOUSING SOCIALE VIA FOLGINO	C17E22000890006	2.200.000,00 €	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
A24 RIQUALIFICAZIONE IRV	C17E22000200006	7.000.000,00 €	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
A25 RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI TIRGATE E GADANO	C12E22000000006	1.650.000,00 €	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
A26 RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI LOMBARDA E FRANZOJ	C12E22000100006	1.250.000,00 €	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
A27 RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO MASSARI	C12E22000060006	2.178.720,00 €	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
A28 RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO NEBIOLA 1	C12E22000030006	950.000,00 €	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
A29 RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO NEBIOLA 2	C12E22000040006	600.000,00 €	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
A30 RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI PASSO BIKOLE, COLLETTA, CECCHI, RUFFINI	C12E22000020006	1.850.000,00 €	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
A31 RIQUALIFICAZIONE SCUOLE AREA EST	C17E22000090006	2.000.000,00 €	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
A32 RIQUALIFICAZIONE SCUOLE AREA NORD	C17E22000050006	5.300.000,00 €	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
A33 RIQUALIFICAZIONE SCUOLE AREA OVEST	C17E22000090006	3.000.000,00 €	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
A34 RIQUALIFICAZIONE SCUOLE AREA SUD	C17E22000060006	4.700.000,00 €	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
A35 CO-PROGETTAZIONE CON IL TERZO SETTORE	C14E22000090006	4.538.275,11 €	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
A36 ACCOMPAGNAMENTO E PARTECIPAZIONE	C14E22000050006	2.000.000,00 €	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

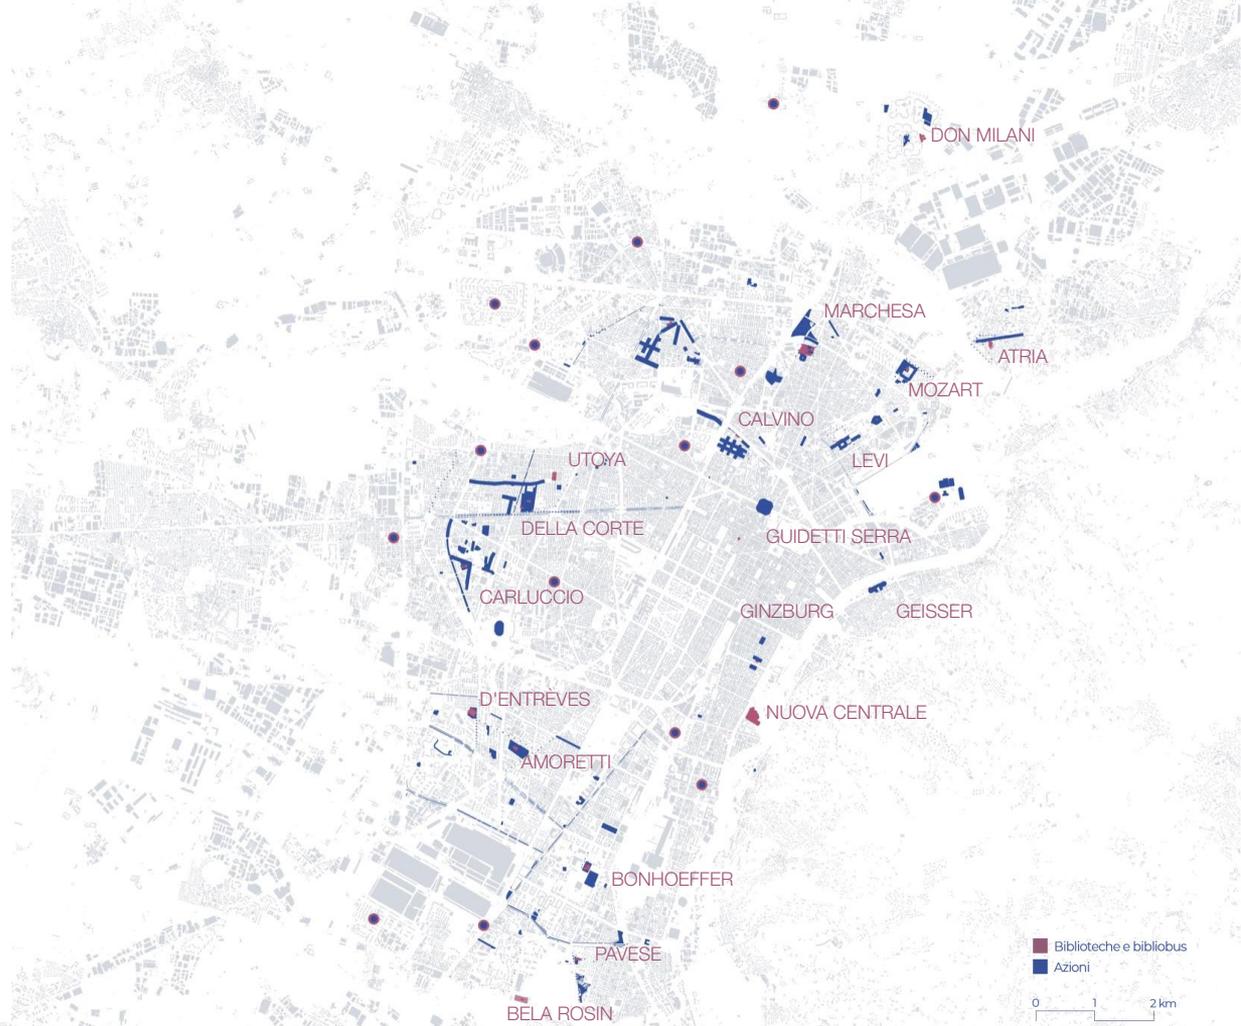

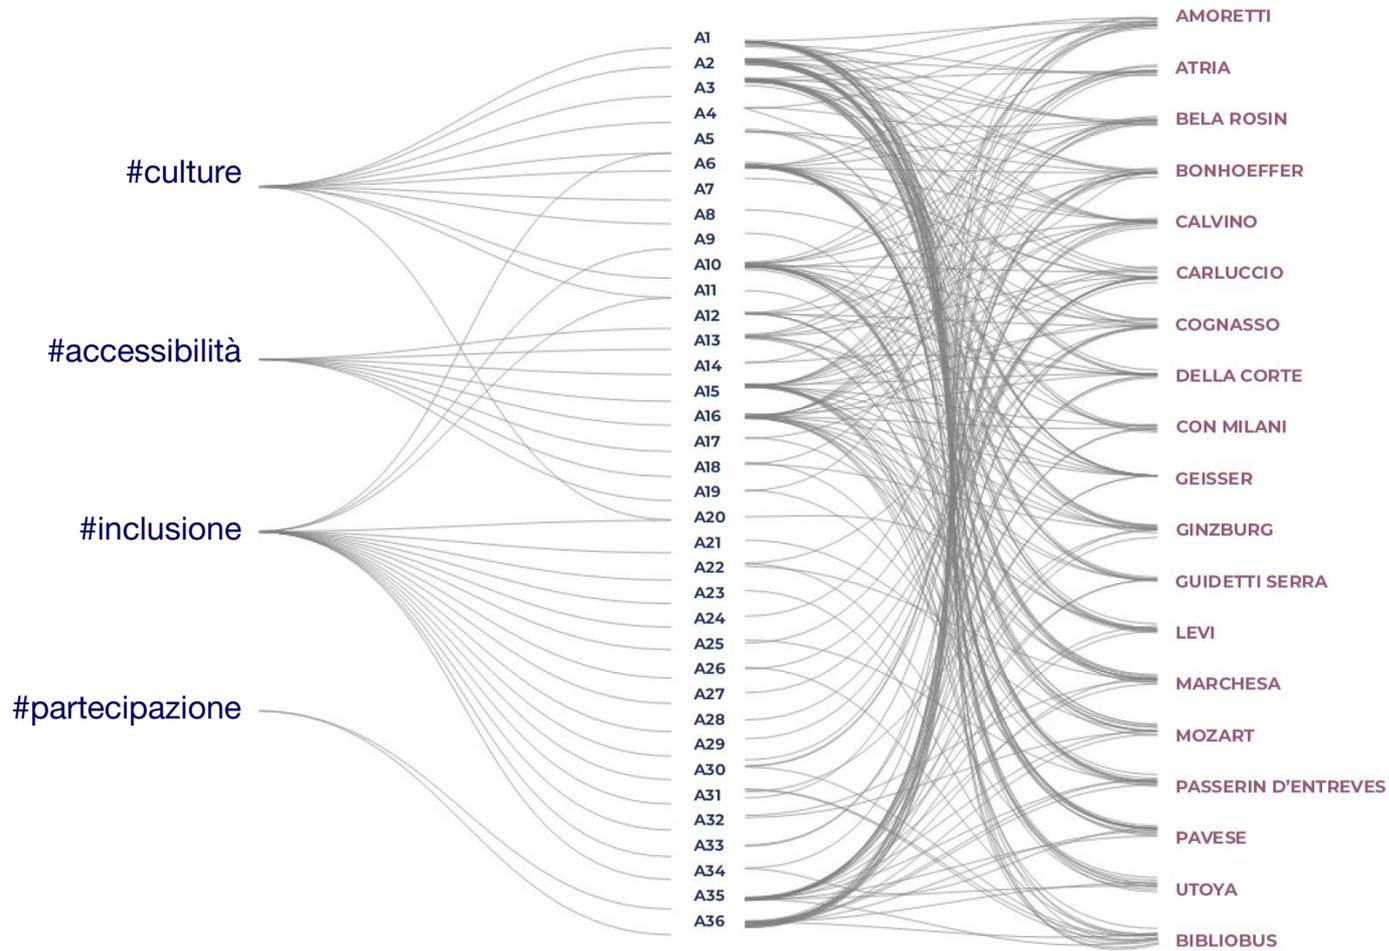

ORGANIZZAZIONE

MINISTERO DEGLI INTERNI

entrata

Città Metropolitana

*rendicontazione
monitoraggio*

Dip. Fondi Europei e PNRR

Divisione Trasformazione Periferie, Beni Comuni e Rigenerazione Urbana

*assistenza
specialistica*

*coordinamento
gestione
spesa*

documentazione

Dip. Risorse Finanziarie

Servizio Gare PNRR

*assistenza
specialistica*

Servizio Giovani e Pari Opportunità
Divisione Tecnica Patrimonio
Servizio Suolo, Parcheggi
Servizio Economato e Fornitura Beni
Divisione Verde e Parchi
Servizio Edilizia Abitativa Pubblica e per il Sociale
Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport
Servizio Edilizia Scolastica
Servizio Biblioteche
Divisione Servizi Informativi
Servizio Gestione Parco Veicoli
Servizio Economato e Fornitura Beni

A1 - 5.315.485,00 €

Arredi per allestimento spazi interni ed aree esterne delle biblioteche civiche torinesi

Servizio Economato e Fornitura Beni e Servizio Biblioteche

COSA	Forniture di arredi per interni ed esterni da collocarsi presso le sedi del Sistema Bibliotecario Urbano della Città di Torino. Complessivamente gli ambienti interessati ammontano a circa 12.000 mq.
DOVE	Biblioteche Civiche
QUANDO	Avvio fornitura Marzo 2024 (coordinamento con attività di manutenzione delle diverse sedi)
A CHE PUNTO SIAMO	Definizione capitolati tecnici per acquisti

A2 - 2.449.680,00 €

Attrezzature informatiche, impianti audiovisivi e Piattaforma Digitale per le Biblioteche

Servizio Biblioteche e Divisione Servizi Informativi

COSA	Gli articoli della presente fornitura sono destinati alle sedi fisiche del Sistema Bibliotecario Urbano e ad integrare il loro sistema informativo mediante la disponibilità di applicazioni cloud per la gestione di contenuti e servizi.
DOVE	Biblioteche Civiche
QUANDO	Avvio fornitura Marzo 2024 (coordinamento con attività di manutenzione delle diverse sedi)
A CHE PUNTO SIAMO	Definizione capitolati tecnici per acquisti

A3 - 675.000,00 €

Bibliobus

Servizio Biblioteche e Servizio Gestione Parco Veicoli

COSA	La gestione del servizio bibliobus (Bibliobus 2 e Bibliobus 3) delle Biblioteche civiche torinesi è finalizzata ad offrire, attraverso una biblioteca mobile, occasioni di accesso all'informazione, alla conoscenza e attività di promozione della lettura e della cultura, nelle zone cittadine da cui è più difficile servirsi delle sedi del Sistema bibliotecario urbano. Numero soste annue previste (per entrambi i Bibliobus): circa 580
DOVE	Varie postazioni (vedi mappa)
QUANDO	Acquisto Bibliobus: Avvio Agosto 2023 - fornitura Novembre 2024 Servizio Bibliobus: Avvio Gennaio 2025 - fine servizio Dicembre 2025
A CHE PUNTO SIAMO	Stesura capitolato tecnico per acquisto dei Bibliobus

A4 - 2.800.000,00 €

Interventi di restauro e manutenzione su edifici storici sedi delle Biblioteche Civiche Villa Amoretti, Andrea Della Corte e Mausoleo della Bela Rosin

Divisione Tecnica Patrimonio

COSA	Interventi per la manutenzione degli edifici, comprese le relative aree pertinenziali. In particolare si intende eliminare le situazioni di criticità ed arrestare il degrado degli elementi architettonici e decorativi nell'ottica della conservazione e valorizzazione del bene, sempre nel rispetto delle componenti storiche, in quanto gli edifici rivestono un particolare pregio dal punto di vista storico - artistico - architettonico essendo sottoposti a tutela di cui al D.Lgs 42/2004 e s.m.i.
DOVE	Villa Amoretti nel parco Rignon, sede della Biblioteca Civica, sita in Corso Orbassano 200; Mausoleo della Bela Rosin, punto prestito e lettura del servizio bibliotecario, sito in Strada Castello di Mirafiori 148/7; Villa Sartirana nel parco della Tesoriera, sede della Biblioteca Civica Musicale Andrea della Corte, sita in Corso Francia 186.
QUANDO	Avvio cantiere Settembre 2023 - chiusura cantiere Giugno 2025
A CHE PUNTO SIAMO	Gara Accordo Quadro con INVITALIA per Lavori. In fase di esecuzione la progettazione esecutiva

A5 - 6.300.000,00 €

Interventi di manutenzione straordinaria sulle Biblioteche Civiche Dietrich Bonhoeffer, Natalia Ginzburg, Cascina Marchesa e della Cdq Più Spazioquattro

Divisione Tecnica Patrimonio

COSA	Adeguamento funzionale degli edifici; riqualificazione di un edificio ora parzialmente inutilizzato (punto lettura di Via Saccarelli 18).
DOVE	Casa del Quartiere San Donato "Più SpazioQuattro" – via Saccarelli 18 Biblioteca ed Auditorium "Cascina Marchesa" – corso Vercelli 141 Biblioteca Dietrich Bonhoeffer, Centro Civico – corso Corsica 55 Biblioteca Natalia Ginzburg, Polo culturale "Lombroso 16" – via Lombroso 16
QUANDO	Fine progettazione Marzo 2023 Avvio cantiere Settembre 2023 - chiusura cantiere Dicembre 2025
A CHE PUNTO SIAMO	Gara Accordo Quadro con INVITALIA con Progettazione definitiva ed esecutiva

A6 - 1.000.000,00 €

Interventi di manutenzione straordinaria della Biblioteca Civica Italo Calvino e Magazzini e ex-fabbrica Superga

Divisione Tecnica Patrimonio

COSA	Opere di riparazione e consolidamento attraverso il ripristino funzionale degli elementi portanti, opere edili-architettoniche per sanare le situazioni di degrado e di cattiva conservazione, opere impiantistiche e oneri per la sicurezza.
DOVE	Lungo Dora Agrigento, 94 Via Orvieto, 57
QUANDO	Avvio cantiere Settembre 2023 - chiusura cantiere Giugno 2025
A CHE PUNTO SIAMO	Gara Accordo Quadro con INVITALIA per Lavori. In fase di esecuzione la progettazione esecutiva

A7 - 5.000.000,00 €

Interventi di manutenzione straordinaria della Biblioteca Civica Luigi Carluccio e Centro Civico

Divisione Tecnica Patrimonio

COSA	Intervento di rinnovo e adeguamento dell'edificio: riqualificazione energetica della struttura; rinnovo degli impianti e la messa in sicurezza del fabbricato; rifacimento delle coperture e delle pensiline; sostituzione delle facciate continue, dei controsoffitti e dei pavimenti; rifacimento degli impianti (elettrico, di illuminazione e videosorveglianza, fan coil, allarme antincendio, antincendio, rete adduzione, rete fognatura); rifacimento delle sistemazioni esterne e della recinzione.
DOVE	Carluccio Via Monte Ortigara, 95
QUANDO	Avvio cantiere Settembre 2023 - chiusura cantiere Dicembre 2025
A CHE PUNTO SIAMO	Gara Accordo Quadro con INVITALIA con Progettazione definitiva ed esecutiva

A8 - 4.000.000,00 €

Interventi edilizi per una nuova Biblioteca Civica nella Circoscrizione 5

Divisione Tecnica Patrimonio

COSA	La Città di Torino ha acquisito degli spazi da destinare alla nuova Biblioteca Cognasso: un capannone coperto, un piano interrato da destinare in parte a parcheggio e in parte a deposito per la biblioteca, una manica laterale da destinare a Caffetteria e una palazzina destinata ad uffici e associazioni. Tali locali devono essere adattati ad ospitare le nuova Biblioteca.
DOVE	via Viterbo 169
QUANDO	Avvio cantiere Settembre 2023 - chiusura cantiere Giugno 2025
A CHE PUNTO SIAMO	Gara Accordo Quadro con INVITALIA con Progettazione esecutiva

A9 - 4.400.000,00 €

Interventi di manutenzione straordinaria del Centro Protagonismo Giovanile e centri socio-assistenziali di Strada delle Cacce 36

Divisione Tecnica Patrimonio

COSA	Rifacimento delle coperture e delle pensiline di accesso; ripristino delle strutture; sostituzione dei serramenti esterni/interni, dei controsoffitti e delle pavimentazioni ammalorate; rifacimento degli impianti (idrosanitario, elettrico, illuminazione e cablaggi e videosorveglianza, fan coil, antincendio, rete adduzione, rete fognatura); rifacimento delle sistemazioni esterne e della recinzione.
DOVE	Strada delle Cacce, 36
QUANDO	Avvio cantiere Settembre 2023 - chiusura cantiere Settembre 2025
A CHE PUNTO SIAMO	Gara Accordo Quadro con INVITALIA con Progettazione esecutiva

A10 - 5.600.000,00 €

Interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione degli edifici di via Frejus 21 e via Bixio 56

Divisione Tecnica Patrimonio

COSA	<p>Centro Rete Via Frejus 21</p> <ul style="list-style-type: none">- palazzina uffici, interventi: riorganizzazione dei locali, messa a norma dei servizi igienici e degli impianti per le dispersioni termiche e gravi carenze di comfort termico, a cui si aggiungono impianti di illuminazione;- edificio dell'ex capannone industriale (SP2): riqualificazione connessa agli aspetti ambientali ed economica; conservazione delle facciate, adeguamento funzionale dello spazio interno e relativi adeguamenti impiantistici, adeguamento alle norme di prevenzione incendi, barriere architettoniche ed efficientamento energetico e idrico del fabbricato. <p>Via Bixio 56 Interventi di manutenzione straordinaria relativamente ai blocchi spogliatoi/servizi igienici e ai serramenti esterni</p> <p>DA DEFINIRE DESTINAZIONE DEL COMPLESSO</p>
DOVE	Via Frejus 21, Via Bixio 56.
QUANDO	Avvio cantiere Settembre 2023 - chiusura cantiere Dicembre 2025
A CHE PUNTO SIAMO	Gara Accordo Quadro con INVITALIA con Progettazione esecutiva

A11 - 4.500.000,00 €

Interventi manutentivi sulle biblioteche Pavese e Passerin d'Entrèves e sui centri di protagonismo giovanile l'Isola che non c'è e Centro Dentro

Divisione Tecnica Patrimonio

COSA	Gli interventi previsti rispondono alla necessità di preservare adeguatamente gli edifici nelle loro funzionalità (via Guido Reni 102 e via Candiolo 79), di migliorare le condizioni di fruizione degli spazi sia uffici che sale polivalenti (via Rubino 24 e corso Siracusa 225). Proposta di intervento: a)ristrutturazione di edifici esistenti, messa a norma dei servizi igienici e degli impianti
DOVE	Pavese via Candiolo 79; Passerin d'Entrèves via Guido Reni 102 L'isola che non c'è via Rubino 24 Centro Dentro c.so Siracusa 225
QUANDO	Avvio cantiere Settembre 2023 - chiusura cantiere Dicembre 2025
A CHE PUNTO SIAMO	Gara Accordo Quadro con INVITALIA con Progettazione esecutiva

A12 - 5.888.000,00 €

Interventi manutentivi sulle pavimentazioni stradali e sui marciapiedi con abbattimento delle barriere architettoniche - Area nord

Servizio Suolo, Parcheggi

COSA	Riqualificazione completa dei percorsi di avvicinamento alle biblioteche Primo Levi, Rita Atria, Andrea della Corte, Cognasso, Italo Calvino. Rifacimento del manto stradale ammalorato e la riparazione ricostruzione dei marciapiedi ammalorati con il contemporaneo intervento di abbattimento delle barriere architettoniche sugli incroci ove ancora mancanti
DOVE	Corso Trapani 160 Corso Vercelli 141 Via Leoncavallo 17 Strada San Mauro 26; Corso Francia 186 Via Viterbo 175. Lungo Dora Agrigento 94.
QUANDO	Avvio cantiere Giugno 2023 - chiusura cantiere Settembre 2024
A CHE PUNTO SIAMO	Gara Accordo Quadro con INVITALIA per Lavori. In fase di esecuzione la progettazione esecutiva

A13 - 6.200.000,00 €

Interventi manutentivi sulle pavimentazioni stradali e sui marciapiedi con abbattimento delle barriere architettoniche - Area Sud

Servizio Suolo, Parcheggi

COSA	Riqualificazione completa dei percorsi di avvicinamento alle biblioteche Carluccio, Geisser, Ginzburg, Passerin, Amoretti, Bela Rosin, Pavese, Bonhoeffer; rifacimento del manto stradale ammalorato, la riparazione e ricostruzione dei marciapiedi ammalorati con il contemporaneo intervento di abbattimento delle barriere architettoniche sugli incroci ove ancora mancanti
DOVE	Via Monte Ortigara 95, Corso Casale 5, Via Lombroso 16; Via G.Reni 102, Corso Orbassano 200, Strada Castello Mirafiori 148. Via Candiolo 79, Corso Corsica 55.
QUANDO	Avvio cantiere Giugno 2023 - chiusura cantiere Settembre 2024
A CHE PUNTO SIAMO	Gara Accordo Quadro con INVITALIA per Lavori. In fase di esecuzione la progettazione esecutiva.

A14 - 2.000.000,00 €

Manutenzione straordinaria delle aree verdi del Parco Rignon e del Parco della Tesoriera

Divisione Verde e Parchi

COSA	Manutenzione e ripristino delle aree verdi del Parco Rignon e del Parco della Tesoriera. Rifacimento rete smaltimento acque meteoriche, impianti, servizi igienici, aree gioco, aree cani, prati e messa a dimora di alberi. Ripristino fontana Tesoriera.
DOVE	Corso Orbassano 200; C.so Francia, 186/192.
QUANDO	Avvio cantiere Ottobre 2023 - chiusura cantiere Marzo 2025
A CHE PUNTO SIAMO	Gara Accordo Quadro con INVITALIA per Lavori. In fase di esecuzione la progettazione esecutiva

A15 - 3.000.000,00 €

Manutenzione straordinaria aree verdi limitrofe alle Biblioteche Civiche

Divisione Verde e Parchi

COSA	Interventi di manutenzione straordinaria delle aree verdi limitrofe alle biblioteche civiche. Nuovi spazi polivalenti, sistemazione di parti verdi (componente vegetale, percorsi, sedute ed arredi ...) e delle attrezzature per il gioco (attrezzature ludiche e pavimentazioni di sicurezza). Nuova segnaletica verticale e orizzontale.
DOVE	Centro Interculturale, in Corso Taranto 160 Biblioteca Civica Luigi Carluccio, in Via Monte Ortigara 95 Biblioteca Civica Cascina Marchesa, in Corso Vercelli 141/7 Biblioteca Civica Cesare Pavese, sita in Via Candiolo 79 Biblioteca Civica A. Passerin d'Entreves, in Via Guido Reni 102 Biblioteca Civica Dietrich Bonhoeffer, in Corso Corsica 55 Biblioteca Civica Primo Levi, in Via Ruggero Leoncavallo 17 Biblioteca Civica Rita Atria, in Strada San Mauro 26a Nuova Biblioteca in Via Viterbo 167 Biblioteca Civica Don Lorenzo Milani, in Via Dei Pioppi 43 I Ragazzi e le Ragazze di Utoya, in Via Zumaglia 39 Biblioteca Civica Italo Calvino, in Lungo Dora Agrigento 94
QUANDO	Avvio cantiere Ottobre 2023 - chiusura cantiere Giugno 2025
A CHE PUNTO SIAMO	Gara Accordo Quadro con INVITALIA per Lavori. In fase di esecuzione la progettazione esecutiva

A16 - 3.000.000,00 €

Riqualificazione aree verdi - Risanamento e potature alberate

Divisione Verde e Parchi

COSA	Potatura di 7.200 alberi esistenti e la messa a dimora di 1.200 alberi ad alto fusto in sostituzione ad alberi abbattuti negli anni. Fornitura e messa a dimora di alberi ad alto fusto comprensiva di cure colturali biennali nelle aree limitrofe alle biblioteche, in sostituzione di alberi precedentemente abbattuti. L'intervento è complessivo del ripristino del sito di impianto e delle cure colturali a garanzia nei primi due anni di impianto.
DOVE	Vari siti nel raggio dei 15 minuti di ogni biblioteca
QUANDO	Avvio cantiere Ottobre 2023 - chiusura cantiere Dicembre 2025
A CHE PUNTO SIAMO	Definizione del capitolato tecnico di gara

A17 - 2.050.000,00 €

Riqualificazione mercati Brunelleschi e Porpora

Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport

COSA	Riqualificazione dei mercati attraverso la revisione degli impianti, la realizzazione della pavimentazione con la definizione degli stalli ad uso commerciale e degli spazi per gli acquirenti. MERCATO BRUNELLESCHI e MERCATO PORPORA: revisione dell'impiantistica esistente, realizzazione della pavimentazione compresa, borchiatura di delimitazione dei banchi del mercato e rifacimento delle aiuole. Inserimento di cartellonistica indicante le biblioteche
DOVE	Corso Brunelleschi tra via Vandalino/via Bardonecchia e corso Peschiera; Via Porpora tra via Boccherini e via Arborio.
QUANDO	Avvio cantiere Luglio 2023 - chiusura cantiere Dicembre 2024
A CHE PUNTO SIAMO	Gara Accordo Quadro con INVITALIA per Lavori. In fase di esecuzione la progettazione esecutiva

A18 - 2.100.000,00 €

Riqualificazione mercati Guala, Pavese, Madama Cristina

Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport

COSA	Riqualificazione dei mercati attraverso la revisione degli impianti, la realizzazione della pavimentazione con la definizione degli stalli ad uso commerciale e degli spazi per gli acquirenti. MERCATO GUALA, realizzazione degli impianti elettrici, idrici e fognari per i banchi alimentari pavimentazione compresa borchiatura di delimitazione dei banchi del mercato, arredo urbano e segnaletica, MADAMA CRISTINA revisione dell'impiantistica esistente e di parte di pavimentazione in pietra, revisione delle tettoie. PAVESE revisione dell'impiantistica esistente e di parte di pavimentazione in pietra, realizzazione della pavimentazione compresa borchiatura di delimitazione dei banchi del mercato, arredo urbano e segnaletica
DOVE	Piazza Guala, Piazza Madama Cristina, Via Cesare Pavese
QUANDO	Avvio cantiere Luglio 2023 - chiusura cantiere Febbraio 2025
A CHE PUNTO SIAMO	Gara Accordo Quadro con INVITALIA per Lavori. In fase di esecuzione la progettazione esecutiva

A19 - 1.800.000,00 €

Riqualificazione mercati Nitti, baltimora, Don Grioli e Sebastopoli

Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport

COSA	Riqualificazione dei mercati attraverso la revisione degli impianti, la realizzazione della pavimentazione con la definizione degli stalli ad uso commerciale e degli spazi per gli acquirenti. MERCATO NITTI, realizzazione degli impianti elettrici, idrici e fognari per i banchi alimentari, realizzazione della pavimentazione compresa borchitura di delimitazione dei banchi del mercato, arredo urbano e segnaletica, MADAMA BALTIMORA realizzazione dell'impianto elettrico interrato per i banchi alimentari, installazione servizio igienico a servizio dell'area mercatale in sostituzione dell'esistente inadeguato, realizzazione dell'impiantistica necessaria, realizzazione della pavimentazione compresa borchitura di delimitazione dei banchi del mercato, arredo urbano e segnaletica. DON GRIOLI ripristino dell'impermeabilizzazione della copertura con guaine di colore chiaro e revisione delle grondaie e dei pluviali e predisposizione di protezioni specifiche ai punti di raccolta acque della stessa, revisione dell'impiantistica esistente e di parte di pavimentazione in cls, sostituzione degli apparecchi di illuminazione utilizzando prodotti più performanti (led etc), arredo urbano e segnaletica, SEBASTOPOLI realizzazione della pavimentazione compresa borchitura di delimitazione dei banchi del mercato, revisione dell'impiantistica esistente, installazione servizio igienico per gli utenti del mercato e realizzazione dell'impiantistica necessaria arredo urbano e segnaletica.
DOVE	Via Nitti angolo via Edoardo Rubino; Via Baltimora tra via Castelgomberto e corso Siracusa; Via Don Grioli angolo via Don Grazioli; Corso Sebastopoli, Agnelli e Orbassano.
QUANDO	Avvio cantiere Luglio 2023 - chiusura cantiere Giugno 2025
A CHE PUNTO SIAMO	Gara Accordo Quadro con INVITALIA per Lavori In fase di esecuzione la progettazione esecutiva

A20 - 3.900.000,00 €

Riqualificazione edifici sociali via Leoncavallo e Biblioteca Levi

Servizio Edilizia Abitativa Pubblica e per il Sociale

COSA	Un intervento di tipo manutentivo sulla metà di fabbricato che si affaccia anche su Via Ternengo (denominato "A"). Un intervento più sostanziale sulla metà di fabbricato che si affaccia anche su Via Pacini (denominato "B"), attualmente usato su n. 3 piani per attività con finalità sociali, il cui ultimo piano risulta in stato di totale abbandono, le cui facciate, serramenti compresi, e coperture presentano numerose criticità. Interventi sulle aree esterne pertinenti al fine di migliorare la fruibilità e/o risolvere problemi di infiltrazioni nel piano interrato.
DOVE	Via Leoncavallo 17/27 Via Pacini 18
QUANDO	Avvio cantiere Novembre 2023 - chiusura cantiere Giugno 2025
A CHE PUNTO SIAMO	Gara Accordo Quadro con INVITALIA con Progettazione definitiva ed esecutiva. In fase di esecuzione la progettazione esecutiva

A21 - 1.000.000,00 €

Riqualificazione edifici sociali via Rosa 13 - Alma Mater

Servizio Edilizia Abitativa Pubblica e per il Sociale

COSA	Interventi di riqualificazione energetica del fabbricato: miglioramento delle prestazioni dell'involucro diminuendo dispersioni di calore dell'edificio riducendo di conseguenza l'energia primaria necessaria alla climatizzazione invernale; posizionamento di isolamento termico sul solaio della copertura per la parte di tetto; sostituzione parte dei serramenti esterni con nuovi infissi, pulizia di tutte le gronde e parziale sostituzione dei pluviali ammalorati; parziale rifacimento di alcuni servizi igienici.
DOVE	Via Rosa 13
QUANDO	Avvio cantiere Novembre 2023 - chiusura cantiere Ottobre 2024
A CHE PUNTO SIAMO	Gara Accordo Quadro con INVITALIA per Lavori. In fase di esecuzione la progettazione esecutiva

A22 - 900.000,00 €

Riqualificazione abitazioni sociali c.so Lombardia, via Pianezza, c.so Lecce, via N. Fabrizi

Servizio Edilizia Abitativa Pubblica e per il Sociale

COSA	<p>CORSO LECCE,64 , ANGOLO VIA NICOLA FABRIZI,55: Abbattimento delle barriere architettoniche; installazione di due ascensori nel cortile interno all'edificio; sostituzione dei serramenti esterni del vano scale.</p> <p>VIA PIANEZZA e CORSO LOMBARDIA : Completo rifacimento dell'Impianto elettrico, impianto citofonico in via Pianezza; impianto di termoregolazione.</p>
DOVE	<p>Corso Lecce, 64 angolo Via Nicola Fabrizi, 55 Via Pianezza 157/163 e Corso Lombardia 12 -123</p>
QUANDO	<p>Avvio cantiere Novembre 2023 - chiusura cantiere Ottobre 2025</p>
A CHE PUNTO SIAMO	<p>Gara Accordo Quadro con INVITALIA per Lavori. In fase di esecuzione la progettazione esecutiva</p>

A23 - 2.200.000,00 €

Intervento di manutenzione straordinaria per riuso e rifunzionalizzazione della casa di accoglienza sociale di Via Foligno 10

Servizio Edilizia Abitativa Pubblica e per il Sociale

COSA	Riuso e la rifunzionalizzazione della casa di ospitalità sociale di via Foligno 10. Demolizione e rifacimento del solaio di copertura con rimozione della copertura.
DOVE	Via Foligno, 10
QUANDO	Avvio cantiere Novembre 2023 - chiusura cantiere Giugno 2025
A CHE PUNTO SIAMO	Gara Accordo Quadro con INVITALIA con Progettazione definitiva ed esecutiva

A24 - 7.000.000,00 €

**Intervento di manutenzione straordinaria con parziale rifunzionalizzazione del complesso Ex-IRV di
Corso Unione Sovietica 220 per il potenziamento dei servizi sociali**

Servizio Edilizia Abitativa Pubblica e per il Sociale

COSA	Allineamento assetto distributivo interno; normalizzazione antincendio; adeguamento strutturale, scale e vano ascensore e rampe di accesso; revisione e implementazione impiantistica, nuovo ascensore; completamento accessi e aree esterne, parcheggi, accessi, area gioco, recinzioni; sistemazione area orti, nuova rete idrica pavimentazioni e percorsi.
DOVE	Corso Unione Sovietica, 220
QUANDO	Avvio cantiere Novembre 2023 - chiusura cantiere Ottobre 2025
A CHE PUNTO SIAMO	Gara Accordo Quadro con INVITALIA con Progettazione definitiva ed esecutiva.

A25 - 1.950.000,00 €

Manutenzione straordinaria diffusa impianto sportivo Trecate e piscina Gaidano

Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport

COSA	Riqualificazione degli spogliatoi; sostituzione della vetrata scorrevole e serramenti; riqualificazione della vasca interna e impermeabilizzazione e del sottofondo; ammodernamento delle componenti tecnologiche, rifacimento dell'impermeabilizzazione della copertura; ammodernamento delle componenti tecnologiche dell'impianto di depurazione acque; riqualificazione di parte della spiaggia della piscina esterna con rifacimento pavimentazione della spiaggia attorno alla piscina esterna; rifacimento dell'impermeabilizzazione della copertura piana fissa.
DOVE	Piscina Trecate Via Vasile Alecsandri, 27/A Piscina Gaidano Via Amedeo Modigliani, 25
QUANDO	Avvio cantiere Luglio 2023 - chiusura cantiere Dicembre 2024
A CHE PUNTO SIAMO	Gara Accordo Quadro con INVITALIA per Lavori. In fase di esecuzione la progettazione esecutiva

A26 - 1.250.000,00 €

Manutenzione straordinaria diffusa piscine Lombardia e Franzoj

Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport

COSA	Riqualificazione degli spogliatoi, bagni e docce, impiantistica idraulica; serramenti interni e rete idraulica di scarico; riqualificazione delle recinzioni; rifacimento guaina impermeabilizzante; rifacimento pavimentazioni esterne; rifacimento vasca piscina esterna e realizzazione di nuova vasca.
DOVE	Piscina Lombardia Corso Lombardia, 95 Piscina Franzoj Str. Antica di Collegno, 211
QUANDO	Avvio cantiere Luglio 2023 - chiusura cantiere Dicembre 2024
A CHE PUNTO SIAMO	Gara Accordo Quadro con INVITALIA per Lavori. In fase di esecuzione la progettazione esecutiva

A27 - 2.178.720,00 €

Manutenzione straordinaria diffusa impianto Massari e acquisizione aree e immobili

Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport

COSA	<p>Riqualificazione degli spogliatoi, bagni e docce; rifacimento completo dell'impianto idraulico di scarico, riqualificazione della linea idrica di carico dell'acqua della vasca; realizzazione di nuova vasca di compenso. Accessibilità e Adattabilità barriere architettoniche. Garantire la gestione unitaria dell'immobile.</p> <p>Acquisto parte non in proprietà valore pari a 1.678.720,00 €</p>
DOVE	Via Massari, 114
QUANDO	Avvio cantiere Luglio 2023 chiusura cantiere Dicembre 2024
A CHE PUNTO SIAMO	Gara Accordo Quadro con INVITALIA per Lavori. In fase di esecuzione la progettazione esecutiva

A28 - 950.000,00 €

Manutenzione straordinaria impianto sportivo Stadio Primo Nebiolo - Pista di Atletica

Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport

COSA	Rifacimento blocco servizi e spogliatoio maschile e inserimento di W.C. disabili; rifacimento della pista di atletica; retopping in colato su manto prefabbricato; riqualificazione del campo sportivo e dell'impianto di irrigazione; rifacimento dell'impianto idrico pista
DOVE	Stadio Primo Nebiolo Viale Hugues Luigi, 10 (Parco Ruffini)
QUANDO	Avvio cantiere Luglio 2023 chiusura cantiere Dicembre 2024
A CHE PUNTO SIAMO	Gara Accordo Quadro con INVITALIA per Lavori. In fase di esecuzione la progettazione esecutiva

A29 - 600.000,00 €

Manutenzione straordinaria dell'impianto sportivo Stadio Primo Nebiolo. Riqualificazione

Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport

COSA	Riqualificazione e messa a norma delle torri faro dello stadio; rifacimento dell'impianto di illuminazione del campo di calcio; realizzazione di percorsi per ipovedenti e mappe tattili.
DOVE	Stadio Primo Nebiolo Viale Hugues Luigi, 10 (Parco Ruffini)
QUANDO	Avvio cantiere Luglio 2023 chiusura cantiere Dicembre 2024
A CHE PUNTO SIAMO	Gara Accordo Quadro con INVITALIA per Lavori. In fase di esecuzione la progettazione esecutiva

A30 - 1.850.000,00 €

Manutenzione straordinaria impianto sportivo Passo Buole, Palestra Cecchi, Piscina Colletta e campi da calcio Ruffini e Colletta

Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport

COSA	Rifacimento del manto di gioco e tracciatura del campo e panchine; riqualificazione degli spogliatoi, bagni e docce, impiantistica idraulica; serramenti interni e rete idraulica di scarico; riqualificazione delle recinzioni; rifacimento guaina impermeabilizzante; rifacimento pavimentazioni esterne; rifacimento vasca piscina esterna e realizzazione di nuova vasca; riqualificazione componenti impiantistica tecnologica di trattamento acque.
DOVE	Campi Calcio Ruffini, Corso Carlo Piaggia (Parco Ruffini, fronte C.so Brunelleschi) Impianto Sportivo Passo Buole, via Passo Buole, 96 Palestra Cecchi, via Cecchi, 14 Piscine Colletta, via Ragazzoni 5 Campi Calcio Colletta, Via Aleramo, 24
QUANDO	Avvio cantiere Luglio 2023 chiusura cantiere Dicembre 2024.
A CHE PUNTO SIAMO	Gara Accordo Quadro con INVITALIA per Lavori. In fase di esecuzione la progettazione esecutiva

A31 - 2.000.000,00 €

Lavori di manutenzione straordinaria in edifici scolastici - area est

Servizio Edilizia Scolastica

COSA	Opere di manutenzione straordinaria per rinnovare e sostituire componenti edilizi degli edifici che non alterano i volumi e le superfici dell'edificio e non comportano modifiche della destinazione d'uso, ne alternano le componenti ambientali esistenti.
DOVE	Scuola primaria "Pellico succ. Parato", Via Aquileia 8 Scuola secondaria di primo grado "Morelli", Via Ricasoli 15 Scuola primaria "Rayneri", Corso Guglielmo Marconi 28 Nido d'infanzia "Le Pratoline", Via Lugaro 6 Scuola primaria "Aurora" e scuola secondaria di primo grado "Morelli", Via Cecchi 16-18
QUANDO	Avvio cantiere Luglio 2023 - chiusura cantiere Settembre 2024.
A CHE PUNTO SIAMO	Gara Accordo Quadro con INVITALIA per Lavori. In fase di esecuzione la progettazione esecutiva

A32 - 5.300.000,00 €

Lavori di manutenzione straordinaria in edifici scolastici - area nord

Servizio Edilizia Scolastica

COSA	Opere di manutenzione straordinaria per rinnovare e sostituire componenti edilizi degli edifici che non alterano i volumi e le superfici dell'edificio e non comportano modifiche della destinazione d'uso, ne alternano le componenti ambientali esistenti.
DOVE	Scuola Primaria "NOVARO" di via Corelli 4 ; Scuola secondaria di primo grado "ex PERGOLESI" via Ancina 15 ; Scuola dell'Infanzia Comunale di via Tronzano 20; Complesso Cascina Marchesa Scuola Primaria e Scuola secondaria di primo grado Corso Vercelli 141/6/8
QUANDO	Avvio cantiere Luglio 2023 - chiusura cantiere Marzo 2025
A CHE PUNTO SIAMO	Gara Accordo Quadro con INVITALIA per Lavori. In fase di esecuzione la progettazione esecutiva

A33 - 3.000.000,00 €

Lavori di manutenzione straordinaria in edifici scolastici - area ovest

Servizio Edilizia Scolastica

COSA	Opere di manutenzione straordinaria per rinnovare e sostituire componenti edilizi degli edifici che non alterano i volumi e le superfici dell'edificio e non comportano modifiche della destinazione d'uso, ne alternano le componenti ambientali esistenti.
DOVE	Scuola Secondaria di primo grado "Maritano" via Marsigli 25 Scuola Dell'infanzia Via Fattori 113 Scuola Primaria "Baricco" corso Peschiera 380 Scuola dell'infanzia "Gianburrasca" via Pozzo Strada 12/1 Scuola Primaria "Fattori" Via Castellino 10
QUANDO	Avvio cantiere Luglio 2023 - chiusura cantiere Dicembre 2024
A CHE PUNTO SIAMO	Gara Accordo Quadro con INVITALIA per Lavori. In fase di esecuzione la progettazione esecutiva

A34 - 4.700.000,00 €

Lavori di manutenzione straordinaria in edifici scolastici - area sud

Servizio Edilizia Scolastica

COSA	Opere di manutenzione straordinaria per rinnovare e sostituire componenti edilizi degli edifici che non alterano i volumi e le superfici dell'edificio e non comportano modifiche della destinazione d'uso, ne alternano le componenti ambientali esistenti.
DOVE	Scuola Primaria "I.C CAIROLI" via Torrazza Piemonte, 10 Scuola Primaria "IC SIDOLI" via Sidoli 10 Scuola Primaria "RE UMBERTO I" via Nizza 395 Scuola Primaria "KANDINSKIJ" via Monte Corno 21
QUANDO	Avvio cantiere Luglio 2023 - chiusura cantiere Marzo 2025
A CHE PUNTO SIAMO	Gara Accordo Quadro con INVITALIA per Lavori - In fase di esecuzione la progettazione esecutiva

A35 - 4.538.275,11 €

Co-progettazione con il terzo settore e partnership pubblico/privata

Servizio Giovani e Pari Opportunità, Conciliazione dei tempi e Famiglie e Città Universitaria

COSA	Co-progettazione per la realizzazione di azioni ed interventi a favore di adolescenti e giovani. Obiettivo 1: Spazio e Partecipazione per tutti, Obiettivo 2: Informazione e Dialogo costruttivo, Obiettivo 3: Società Inclusiva, Obiettivo 4: Benessere Personale e Sociale, Obiettivo 5: Pari Opportunità ed Uguaglianza di Genere; Riorganizzazione Servizio Informagiovani
DOVE	Nord Ovest: Circoscrizioni 4 e 5 Nord Est: Circoscrizioni 6 e 7 Sud Ovest: Circoscrizioni 2 e 3 Sud Est: Circoscrizioni 1 e 8
QUANDO	Settembre 2023 - Giugno 2025
A CHE PUNTO SIAMO	Bando per la co-programmazione

A36 - 2.000.000,00 € + 100.000 € risorse Città per coordinamento con altri programmi Accompagnamento sociale e facilitazione alla partecipazione della cittadinanza

Divisione Trasformazioni Periferie, Beni Comuni e Rigenerazione Urbana

COSA	Apertura sportelli fissi (nelle biblioteche) e mobili, per il coordinamento, l'accompagnamento e la la partecipazione al piano integrato
DOVE	Lotto 1 / Circoscrizioni 2 - 8 Amoretti, Passerin d'Entrèves, Pavese Lotto 2 / Circoscrizioni 3 - 4 - 5 Carluccio, Della Corte, Cognasso, Utoya Lotto 3 / Circoscrizioni 6 - 7 Levi, Don Milani, Mozart
QUANDO	Marzo 2023 - Giugno 2026
A CHE PUNTO SIAMO	Gara in corso di pubblicazione
